

1 Planning & méthodologie

1.1 Vue d'ensemble


Projet sur 20 mois (décembre 2025 → juillet 2027), en trois phases : **Conception** (livrables pour la keynote de juillet 2026), **Développement** (les 11 epics produit, en parallèle), **Intégration** (assemblage, tests, stabilisation). Le parallélisme est possible car les composants sont volontairement peu couplés ; le portail vétérinaire (E7) est le seul vraiment dépendant (backend + IA), d'où un démarrage plus tardif.

1.2 Diagramme de Gantt

Le diagramme ci-après (page suivante, en paysage) est **aligné sur les 11 epics du WBS** (mêmes codes E1–E11, mêmes couleurs de domaine) avec des **dates issues du backlog Jira**, pour une traçabilité directe WBS → PRD → Jira. Il reflète le travail réel de **5 pôles en parallèle** : aucun epic n'attend qu'un autre soit terminé. Chaque epic démarre par une **préparation** non bloquante (segment clair : design, maquettes / mocks, simulateur, machinerie) puis **consolide** quand sa dépendance réelle est prête (segment plein). Le **chemin critique** (●) et les **jalons** (◆) sont positionnés sur la frise ; la colonne du mois courant est surlignée. Le séquençement est justifié sous le diagramme.

Diagramme de Gantt · Pawrise Care

Barre = epic (couleur = domaine WBS) · consolidation / intégration · préparation (design / mocks / simulateur / machinerie) · chemin critique · jalon · mois courant

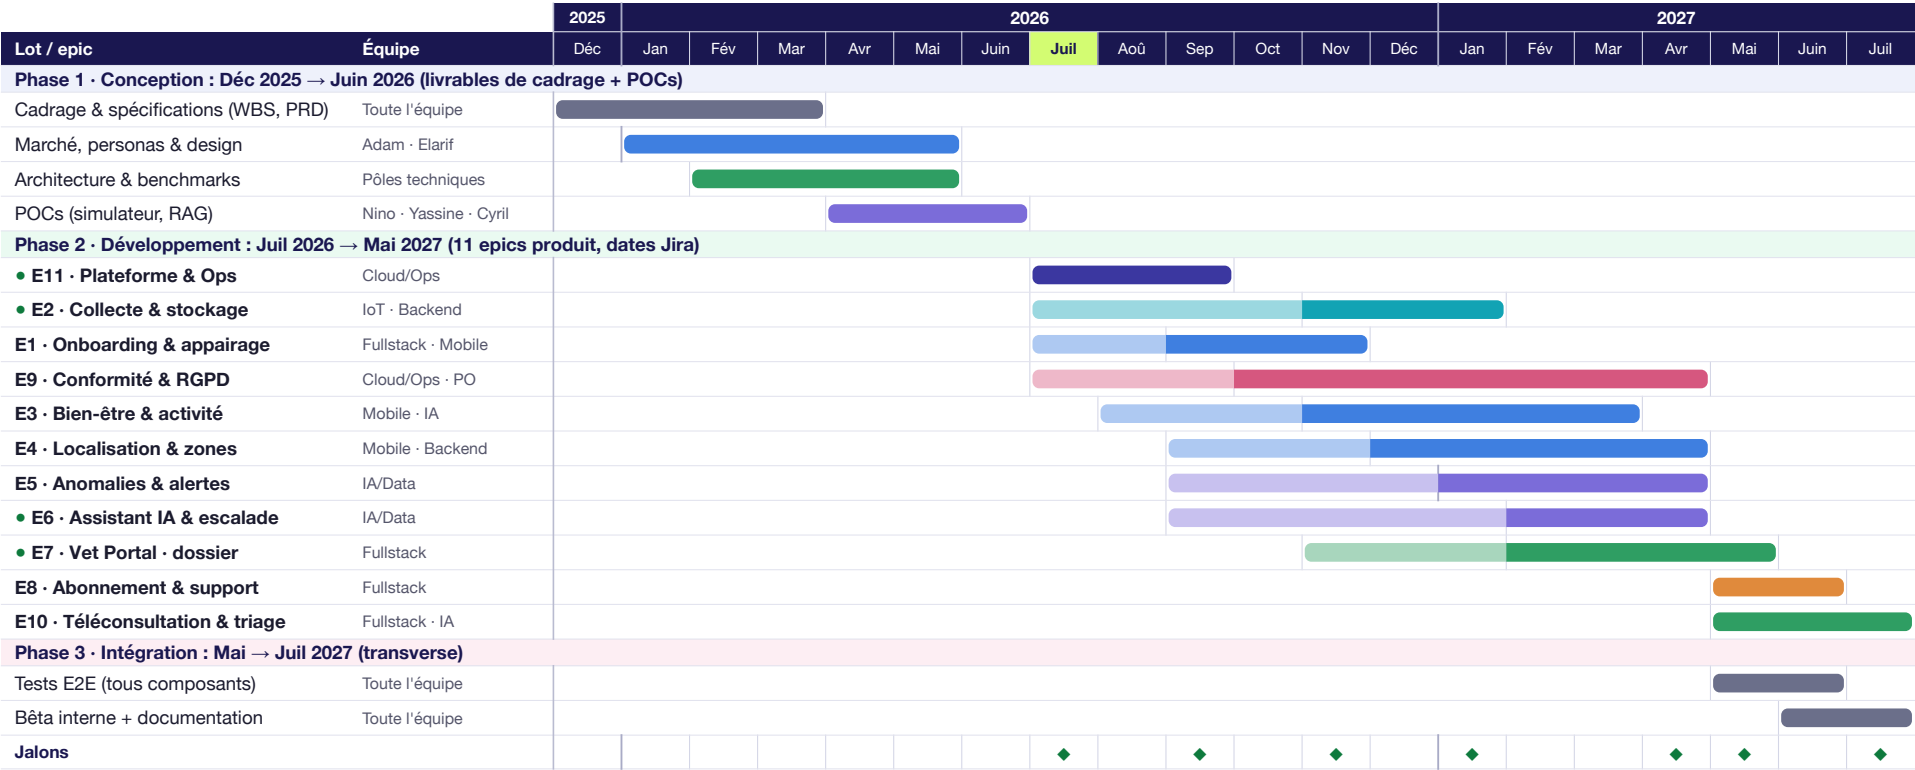

Jalons : ♦ Keynote (juil. 2026) · Infra op. (sept.) · Simulateur (nov.) · Backend complet (janv. 2027) · MVP intégré (avr.) · Portail Vétro (mai) · Fin de projet (juil. 2027). E8 et E10 sont post-MVP (démarrage après le MVP d'avril 2027). Détail en table ci-après.

1.3 Jalons

#	Date	Jalon
1	Juil 2026	Keynote (tous les livrables de conception prêts)
2	Sep 2026	Infrastructure opérationnelle (E11)
3	Nov 2026	Simulateur collier (dé-risquage E2)
4	Jan 2027	Backend complet (E1, E2)
5	Avr 2027	MVP intégré (E3–E6, E9 : Care Engine + backend)
6	Mai 2027	Portail vétérinaire livré (E7)
7	Juil 2027	Fin de projet (E8, E10, intégration : produit testé et stabilisé)

1.4 Séquencement & dépendances

Les 5 pôles avancent en parallèle dès juillet ; **aucun pôle n'est bloqué** : chacun démarre la part non bloquante de son epic (design, maquettes / mocks, simulateur, machinerie) et ne **consolide** qu'une fois la dépendance réelle disponible. Quatre dépendances structurent l'ordre :

- **E11 Plateforme (socle)** : tout se déploie sur l'infrastructure ; construite en premier (juil. → sept.), puis exploitée en continu (déploiements, monitoring, RGPD infra).
- **E2 Collecte → features & IA** : la donnée alimente tout. Le **simulateur** (dès juillet) permet aux features (E3, E4) et à l'IA (E5, E6) de démarrer sur données simulées, sans attendre le collier réel.
- **Baseline de données → E5 Anomalies** : détecter une anomalie exige plusieurs mois d'historique par animal (démarrage à froid). La machinerie se prépare dès septembre ; le calibrage sur données réelles vient en décembre.
- **E6 IA + E2 données → E7 Vet Portal** : le portail affiche résumés et alertes. Son échafaudage démarre sur mocks (nov.) ; le câblage aux vraies sorties IA vient en février.

E8 (abonnement) et **E10 (téléconsultation)** sont **post-MVP** : différés par priorité (non requis pour valider le produit), pas par blocage technique.

1.5 Méthodologie

Scrum adapté (agile itératif). Le périmètre évolue avec les apprentissages (POCs IA, faisabilité hardware, retours du vétérinaire partenaire) : on livre par incréments, on réoriente à chaque sprint. Sprints de 2 semaines, daily / point d'équipe, sprint review, rétrospective. Rôles : Product Owner (Yassine), Scrum Master tournant, équipe par pôles. Outils : Jira (backlog, sprints, story points), Confluence (docs), GitHub (code, PR, CI), Figma (design).

Alternatives écartées : Waterfall (cahier des charges figé, incompatible avec l'incertitude R&D) ; Kanban pur (pas de cadence ni d'engagement de sprint, peu de prévisibilité pour 10 personnes) dont on retient le tableau visuel et la limite de WIP.

Estimation : Planning Poker sur échelle de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13). Au-delà de 13 points, le ticket est découpé.

1.6 Outil de pilotage (Jira)

Le projet est piloté sur un board **Jira** (projet SCRUM, pawrise.atlassian.net) adopté par les **10 membres** : backlog produit, sprints, estimation en story points (Planning Poker) et **assignation nominative** des tâches. Les 11 epics du Gantt y portent leurs dates de début et d'échéance. Confluence héberge la documentation, GitHub le code et les revues (Pull Requests + CI), Figma le design. Le suivi des livraisons s'appuie sur un flux à quatre statuts.

Indicateur	Valeur
Tickets	170+ (epics, tâches, sous-tâches, user stories)
Epics	23 · 12 cadrage & documentation, 11 produit
User stories produit	66, chacune avec critères d'acceptation Given/When/Then
Membres avec tickets assignés	10 / 10
Flux de statuts	À faire → En cours → Revue → Terminé
