


1 Planning & méthodologie

1.1 Vue d'ensemble

Projet sur 20 mois (décembre 2025 → juillet 2027), en trois phases : **Conception** (livrables pour la keynote de juin 2026), **Développement** (tous les composants en parallèle), **Intégration** (assemblage, tests, stabilisation). Le parallélisme est possible car les composants sont volontairement peu couplés ; le portail vétérinaire est le seul vraiment dépendant (backend + IA), d'où un démarrage plus tardif.

1.2 Diagramme de Gantt

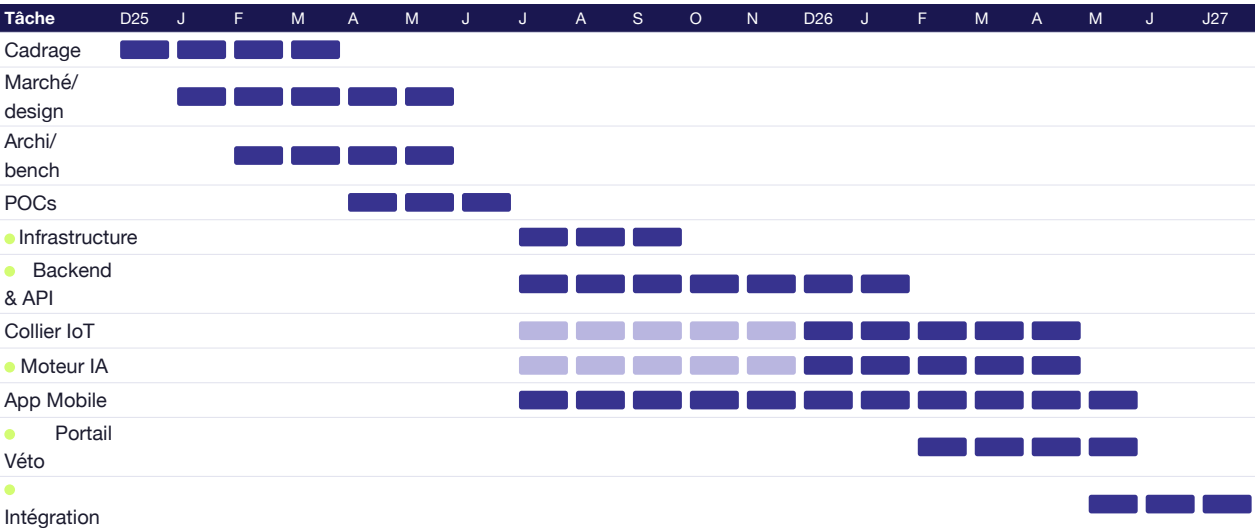

● chemin critique · zone claire = phase de dé-risquage (simulateur / POC) avant l'engagement du coûteux.

1.3 Jalons

#	Date	Jalon
1	Juin 2026	Keynote (tous les livrables de conception prêts)
2	Sep 2026	Infrastructure opérationnelle
3	Nov 2026	Simulateur collier
4	Jan 2027	Backend complet
5	Avr 2027	MVP intégré (Care Engine + backend)
6	Mai 2027	Portail vétérinaire livré
7	Juil 2027	Fin de projet (produit testé et stabilisé)

1.4 Dépendances clés

- **Infrastructure** → **Backend** : le backend se déploie sur l'infrastructure.
- **Simulateur collier** → **Moteur IA** : l'IA s'entraîne et se teste sur des données simulées.
- **Backend (API)** → **App Mobile** : l'app consomme les API au fil de l'eau.
- **Moteur IA + Backend** → **Portail Vétô** : alertes et rapports viennent de l'IA et des données.

1.5 Méthodologie

Scrum adapté (agile itératif). Le périmètre évolue avec les apprentissages (POCs IA, faisabilité hardware, retours du vétérinaire partenaire) : on livre par incréments, on réoriente à chaque sprint. Sprints de 2 semaines, daily / point d'équipe, sprint review, rétrospective. Rôles : Product Owner

(Yassine), Scrum Master tournant, équipe par pôles. Outils : Jira (backlog, sprints, story points), Confluence (docs), GitHub (code, PR, CI), Figma (design).

Alternatives écartées : Waterfall (cahier des charges figé, incompatible avec l'incertitude R&D) ; Kanban pur (pas de cadence ni d'engagement de sprint, peu de prévisibilité pour 10 personnes) dont on retient le tableau visuel et la limite de WIP.

Estimation : Planning Poker sur échelle de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13). Au-delà de 13 points, le ticket est découpé.
