


# 1 Planning & méthodologie

## 1.1 Vue d'ensemble

Projet sur 20 mois (décembre 2025 → juillet 2027), en trois phases : **Conception** (livrables pour la keynote de juin 2026), **Développement** (tous les composants en parallèle), **Intégration** (assemblage, tests, stabilisation). Le parallélisme est possible car les composants sont volontairement peu couplés ; le portail vétérinaire est le seul vraiment dépendant (backend + IA), d'où un démarrage plus tardif.

## 1.2 Diagramme de Gantt

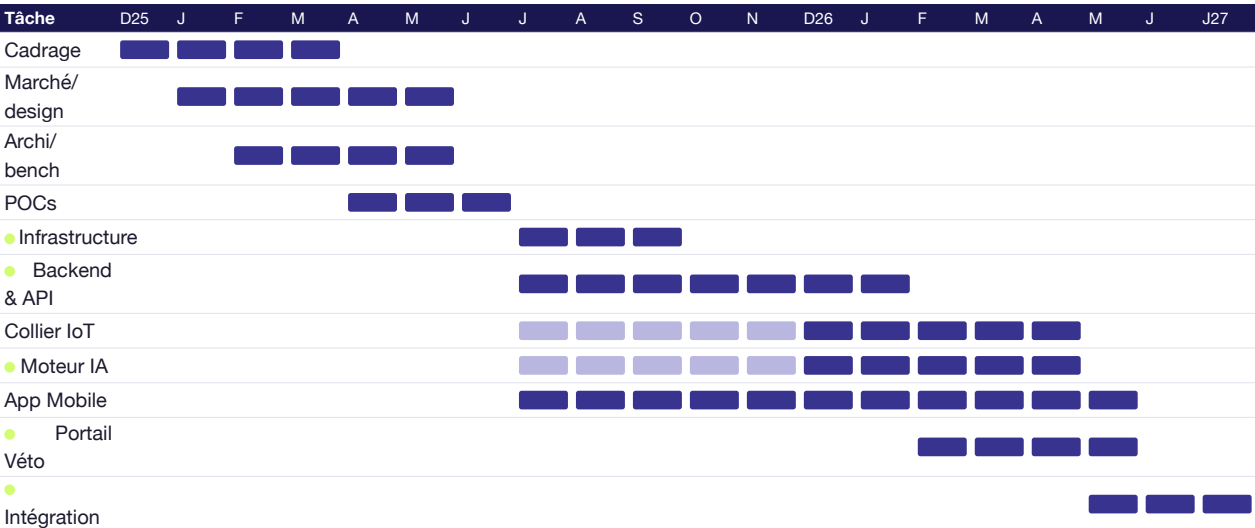

● chemin critique · zone claire = phase de dé-risquage (simulateur / POC) avant l'engagement du coûteux.

## 1.3 Jalons

| # | Date      | Jalon                                            |
|---|-----------|--------------------------------------------------|
| 1 | Juin 2026 | Keynote (tous les livrables de conception prêts) |
| 2 | Sep 2026  | Infrastructure opérationnelle                    |
| 3 | Nov 2026  | Simulateur collier                               |
| 4 | Jan 2027  | Backend complet                                  |
| 5 | Avr 2027  | MVP intégré (Care Engine + backend)              |
| 6 | Mai 2027  | Portail vétérinaire livré                        |
| 7 | Juil 2027 | Fin de projet (produit testé et stabilisé)       |

## 1.4 Dépendances clés

- **Infrastructure** → **Backend** : le backend se déploie sur l'infrastructure.
- **Simulateur collier** → **Moteur IA** : l'IA s'entraîne et se teste sur des données simulées.
- **Backend (API)** → **App Mobile** : l'app consomme les API au fil de l'eau.
- **Moteur IA + Backend** → **Portail Vétéo** : alertes et rapports viennent de l'IA et des données.

## 1.5 Méthodologie

**Scrum adapté** (agile itératif). Le périmètre évolue avec les apprentissages (POCs IA, faisabilité hardware, retours du vétérinaire partenaire) : on livre par incréments, on réoriente à chaque sprint. Sprints de 2 semaines, daily / point d'équipe, sprint review, rétrospective. Rôles : Product Owner

(Yassine), Scrum Master tournant, équipe par pôles. Outils : Jira (backlog, sprints, story points), Confluence (docs), GitHub (code, PR, CI), Figma (design).

**Alternatives écartées :** Waterfall (cahier des charges figé, incompatible avec l'incertitude R&D) ; Kanban pur (pas de cadence ni d'engagement de sprint, peu de prévisibilité pour 10 personnes) dont on retient le tableau visuel et la limite de WIP.

**Estimation :** Planning Poker sur échelle de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13). Au-delà de 13 points, le ticket est découpé.
